

О Т Ч Е Т

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Городской округ Архангельской области «Мирный».

2. Наименование инициативного проекта: Комфорт моего двора.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 2.06. – 30.10.2025

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _____.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Устройство тротуаров, ремонт подходов к подъездам и установка скамеек и урн	2 078 845,85 руб. Имущественное участие в размере – 103 942,29 руб.	ООО «Стройсервис»
	Итого	2 078 845,85 руб.	

* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

** В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.


Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2 078,8	100	2 078,8	100
объем средств областного бюджета	1 870,9	90	1 870,9	90
объем собственных средств местного бюджета	103,95	5	103,95	5
объем инициативных платежей физических лиц	103,95	5	103,95	5
объем инициативных платежей	-	-	-	-

1	2	3	4	5
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		
2		
3		

4

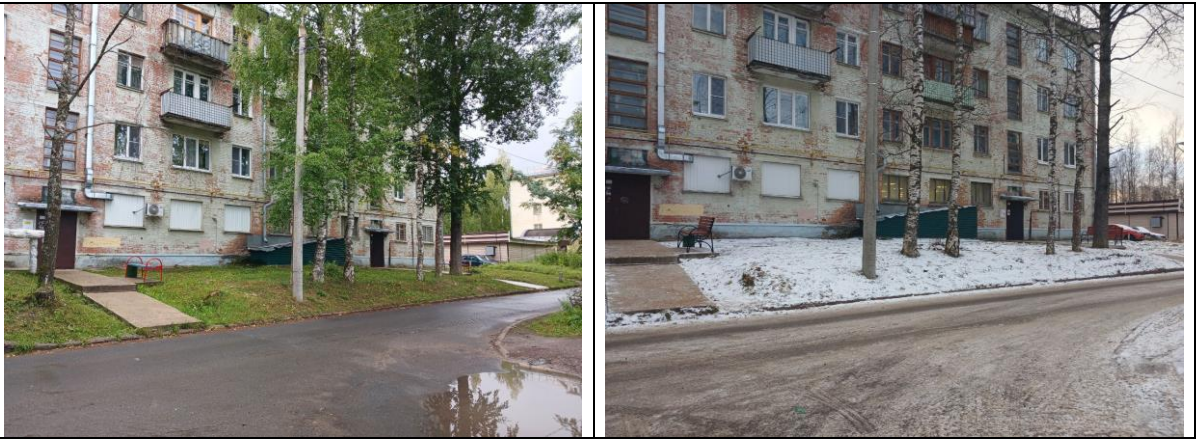

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.
